







































标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2019年4月8日							2019年4月	
							日	一	二	三	四	五	六	日	一
1	启动	3 个工作日	2019年4月8日	2019年4月10日											
2	组建核心团队	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日		项目经理, UI专家									
3	任命项目经理	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日		项目经理									
4	干系人分析	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日		项目经理									
5	里程碑计划	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日		项目经理									
6	制定项目章程	1 个工作日	2019年4月9日	2019年4月9日	3, 4, 5	项目经理									
7	项目启动大会	1 个工作日	2019年4月10日	2019年4月10日	6	项目经理, 需求专家									
8	规划														
9	规划范围	15 个工作日	2019年4月10日	2019年4月30日											
10	界面设计	5 个工作日	2019年4月11日	2019年4月17日	7	需求专家									
11	制定需求说明书	1 个工作日	2019年4月18日	2019年4月18日	10	UI专家, aa[2%]									
12	详细设计说明书	1 个工作日	2019年4月18日	2019年4月18日	10	设计专家									
13	创建WBS	1 个工作日	2019年4月18日	2019年4月18日	10	项目经理									
14	形成范围基准	1 个工作日	2019年4月19日	2019年4月19日	11, 12, 13	项目经理									
15	规划时间	1 个工作日	2019年4月22日	2019年4月22日	14	项目经理									
16	规划时间	4 个工作日	2019年4月23日	2019年4月26日											
17	估算资源	1 个工作日	2019年4月23日	2019年4月23日	15	项目经理									
18	估算持续时间	1 个工作日	2019年4月24日	2019年4月24日	17	项目经理									
19	估算进度	1 个工作日	2019年4月25日	2019年4月25日	18	项目经理									
20	制定进度计划	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	19	项目经理									
21	规划成本	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日											
22	项目成本估算	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日		项目经理									
23	项目预算	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日		项目经理									
24	规划质量	2 个工作日	2019年4月23日	2019年4月24日											
25	制定测试计划	1 个工作日	2019年4月23日	2019年4月23日	15	项目经理									
26	制定测试用例	1 个工作日	2019年4月24日	2019年4月24日	25	项目经理									
27	规划人力资源	2 个工作日	2019年4月24日	2019年4月25日											
28	制定人力资源计划	1 个工作日	2019年4月24日	2019年4月24日	17										
29	制定人员配备管理计划	1 个工作日	2019年4月25日	2019年4月25日	26	项目经理									
30	规划沟通	1 个工作日	2019年4月25日	2019年4月25日											
31	制定沟通管理计划	1 个工作日	2019年4月25日	2019年4月25日	28	项目经理									
32	规划采购	6 个工作日	2019年4月24日	2019年5月1日											
33	自制外购分析	3 个工作日	2019年4月24日	2019年4月26日	17	项目经理									

项目：心悦1 日期：2019年4月8日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			

[illegible]

项目：心悦1 日期：2019年4月8日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	日	2019年4月8日							2019年4	
								一	二	三	四	五	六	日	一	二
67	发布项目信息	1 个工作日	2019年5月13日	2019年5月13日	42	项目经理										
68	报告监控指标	1 个工作日	2019年5月13日	2019年5月13日	42	项目经理										
69	干系人沟通	1 个工作日	2019年5月13日	2019年5月13日	42	项目经理										
70	团队建设	1 个工作日	2019年5月13日	2019年5月13日												
71	培训	1 个工作日	2019年5月13日	2019年5月13日	42	UI专家, 测试员1										
72	娱乐活动	1 个工作日	2019年5月13日	2019年5月13日	42	UI专家, 测试员1										
73	沟通	1 个工作日	2019年5月13日	2019年5月13日	42	UI专家, 测试员1										
74	采购	1 个工作日	2019年5月13日	2019年5月13日	42	UI专家, 测试员1										
75	项目验收	1 个工作日	2019年5月6日	2019年5月6日	43	UI专家, 测试员1										
76	收尾	1 个工作日	2019年5月7日	2019年5月7日												
77	项目终验	1 个工作日	2019年5月7日	2019年5月7日	75	UI专家, 设计专家										
78	结束采购	1 个工作日	2019年5月7日	2019年5月7日	75	项目经理										
79	项目内部收尾	1 个工作日	2019年5月7日	2019年5月7日	75	UI专家, 测试员1										



项目：心悦1

日期：2019年4月8日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间


外部任务

外部里程碑







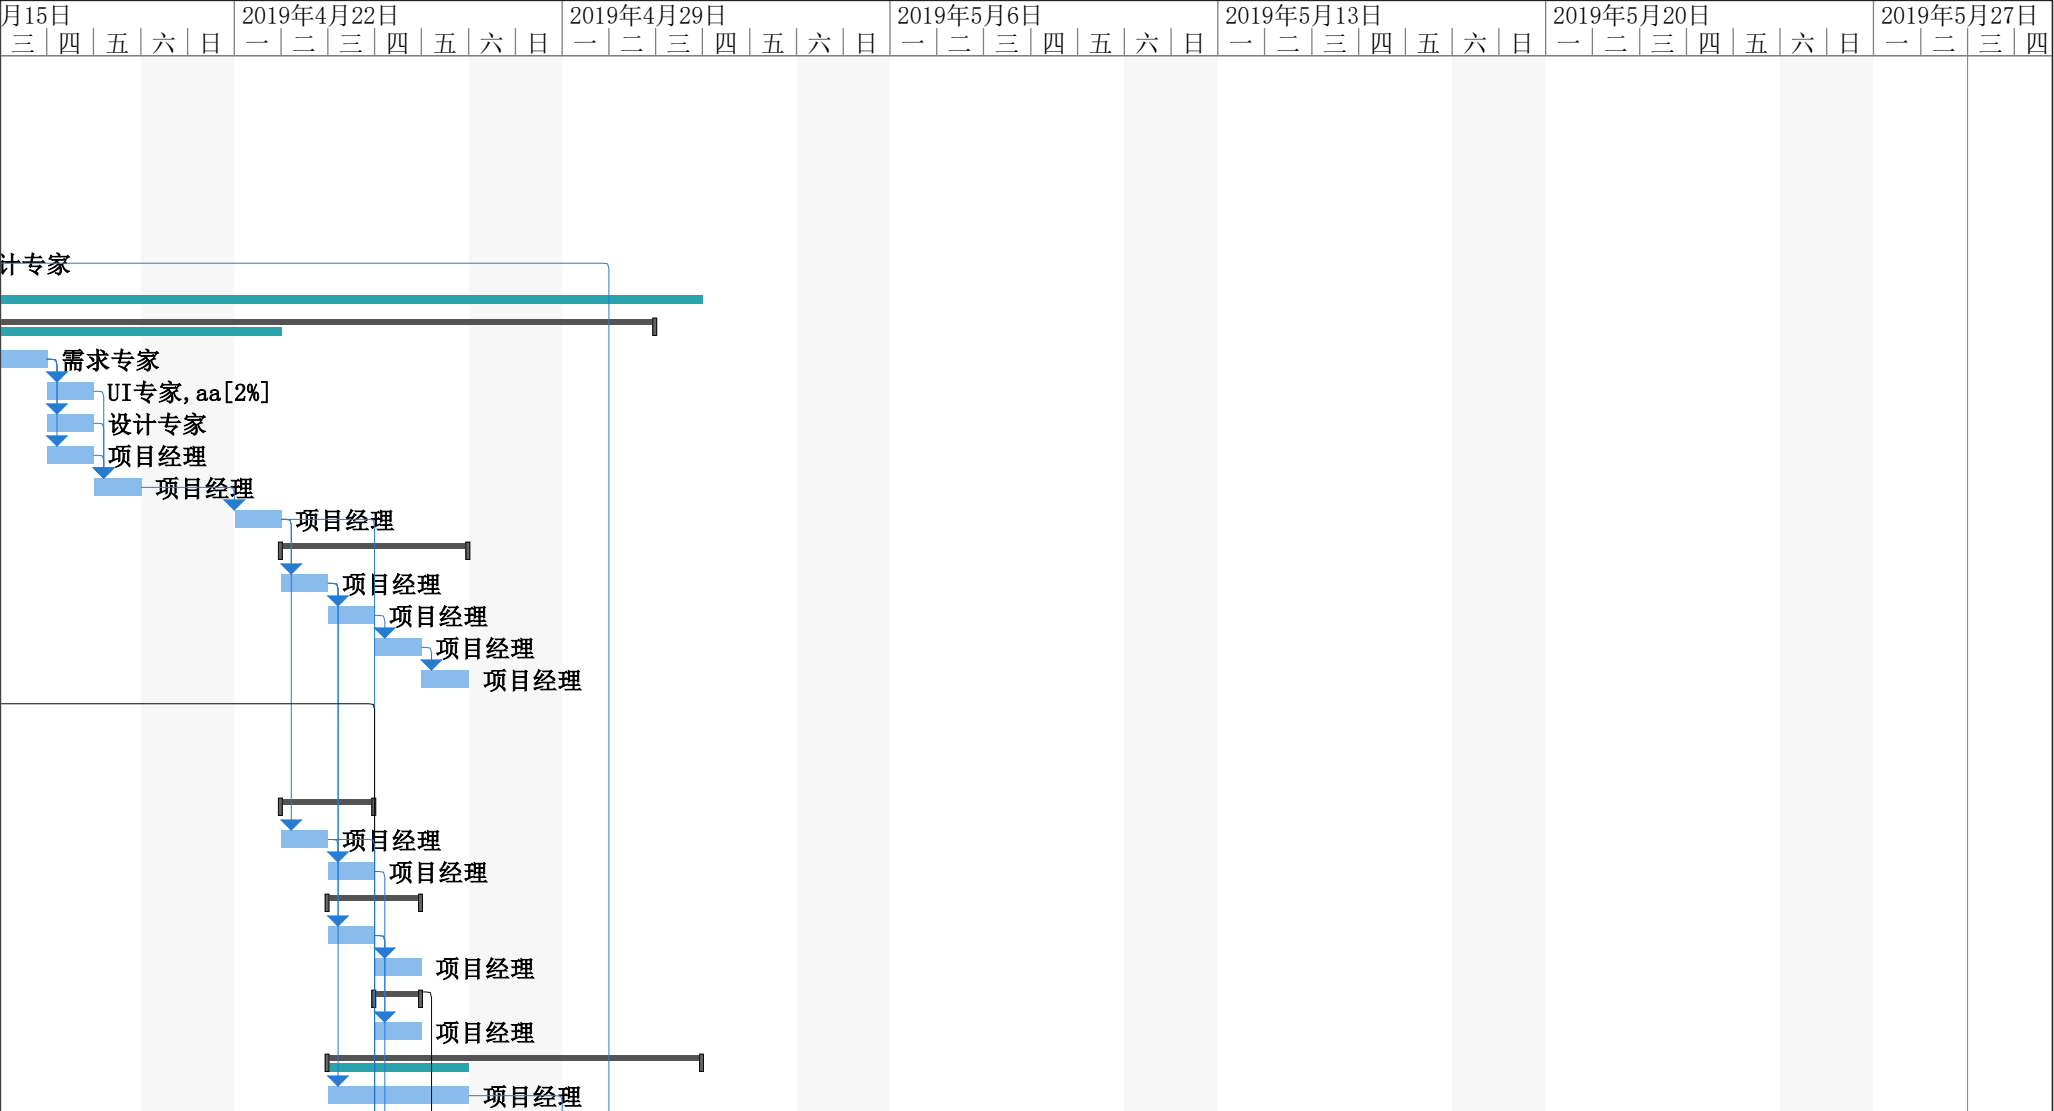












最后期限


进度

手动进度



项目：心悦1
日期：2019年4月8日

任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
项目摘要		仅工期		外部任务			

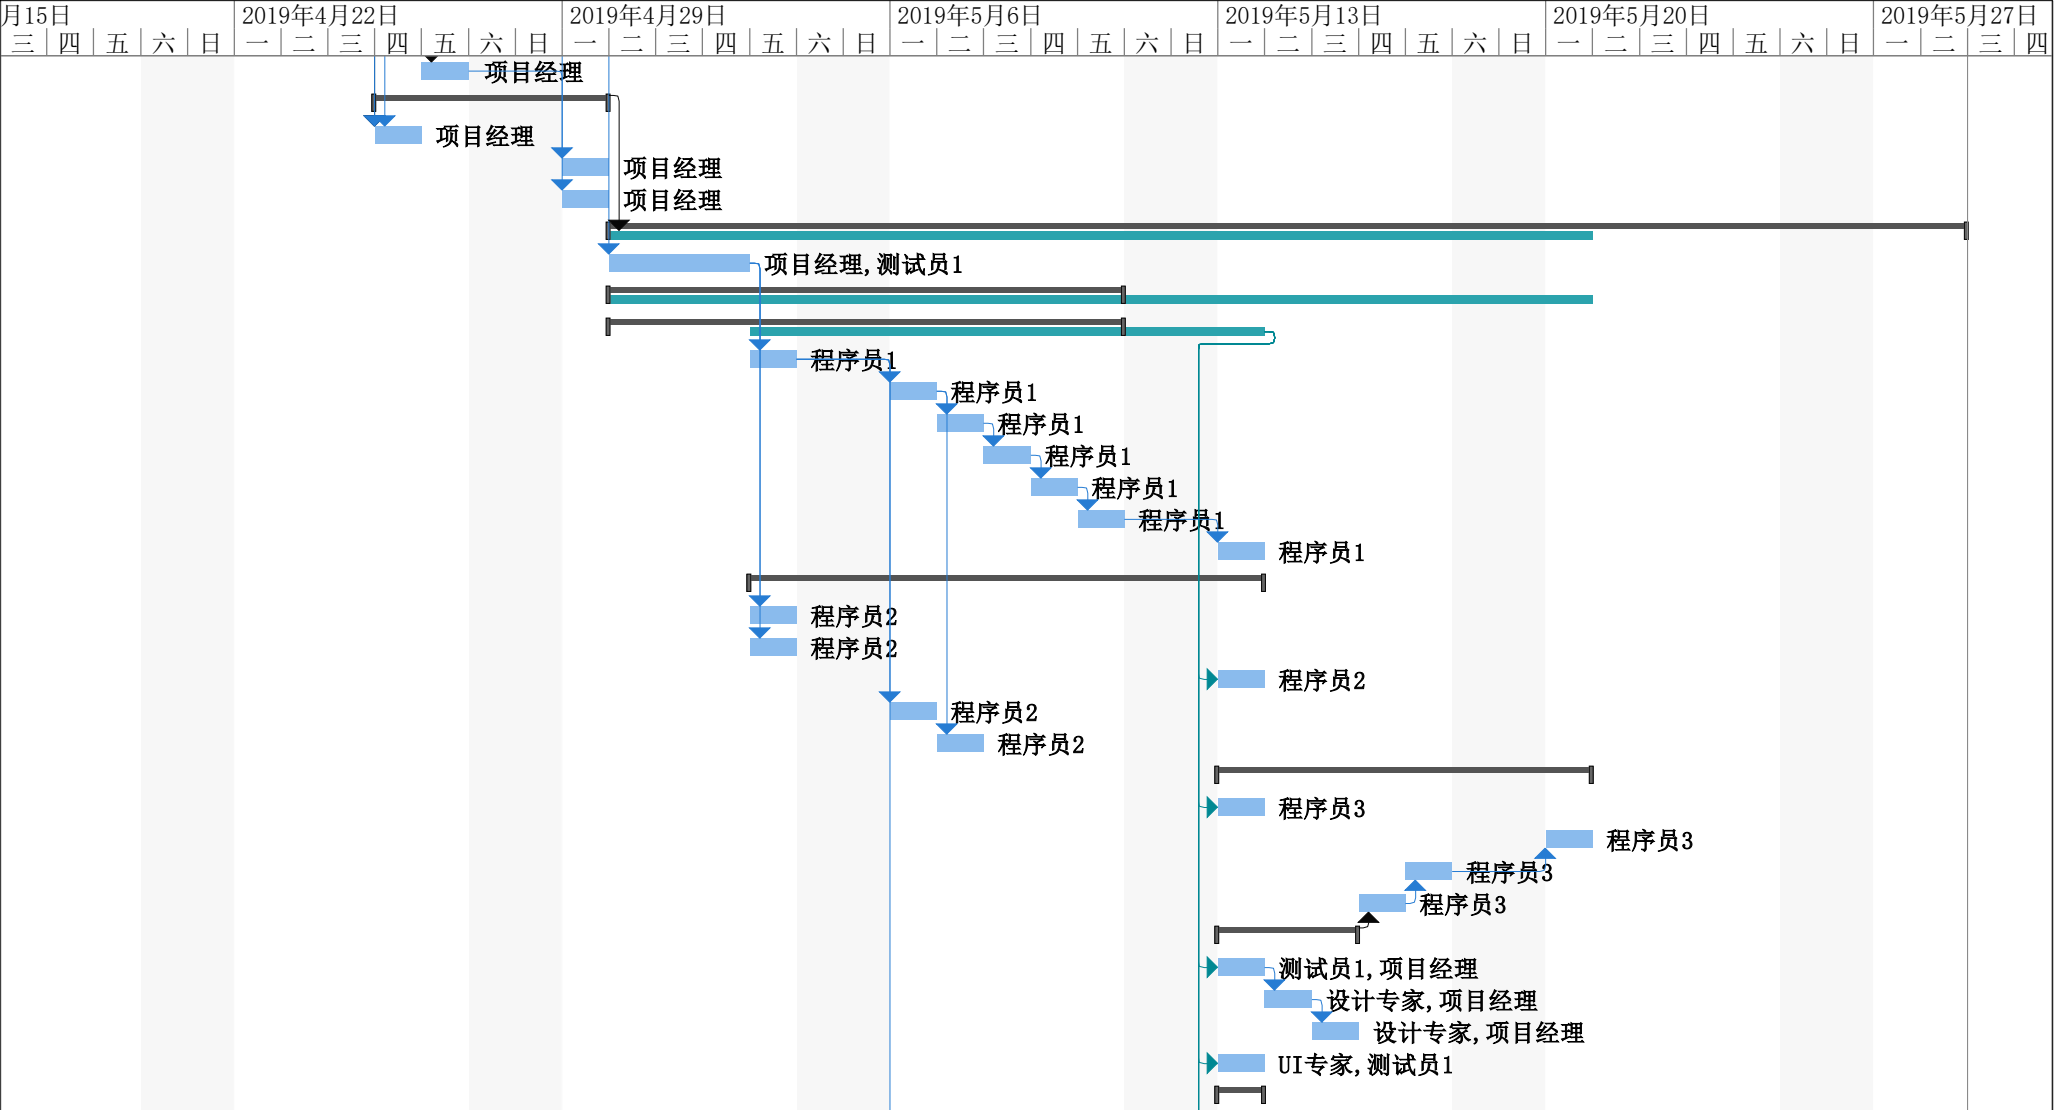

项目：心悦1
日期：2019年4月8日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

◆

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑



最后期限

进度

手动进度

◇

↓

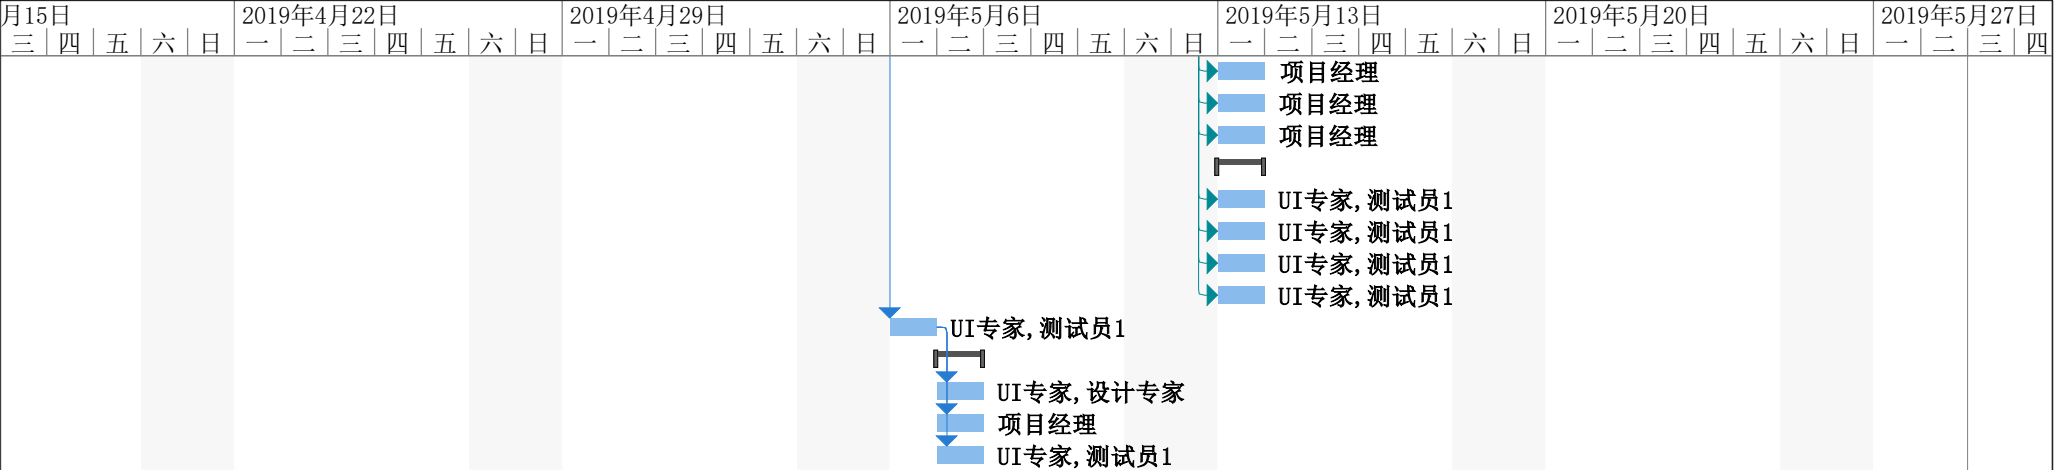

项目：心悦1 日期：2019年4月8日	任务		非活动任务		非活动里程碑		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限			
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度			
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度			
	项目摘要		仅工期		外部任务					
